


# สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

งบลงทุน เงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เขตพื้นที่บางพระ

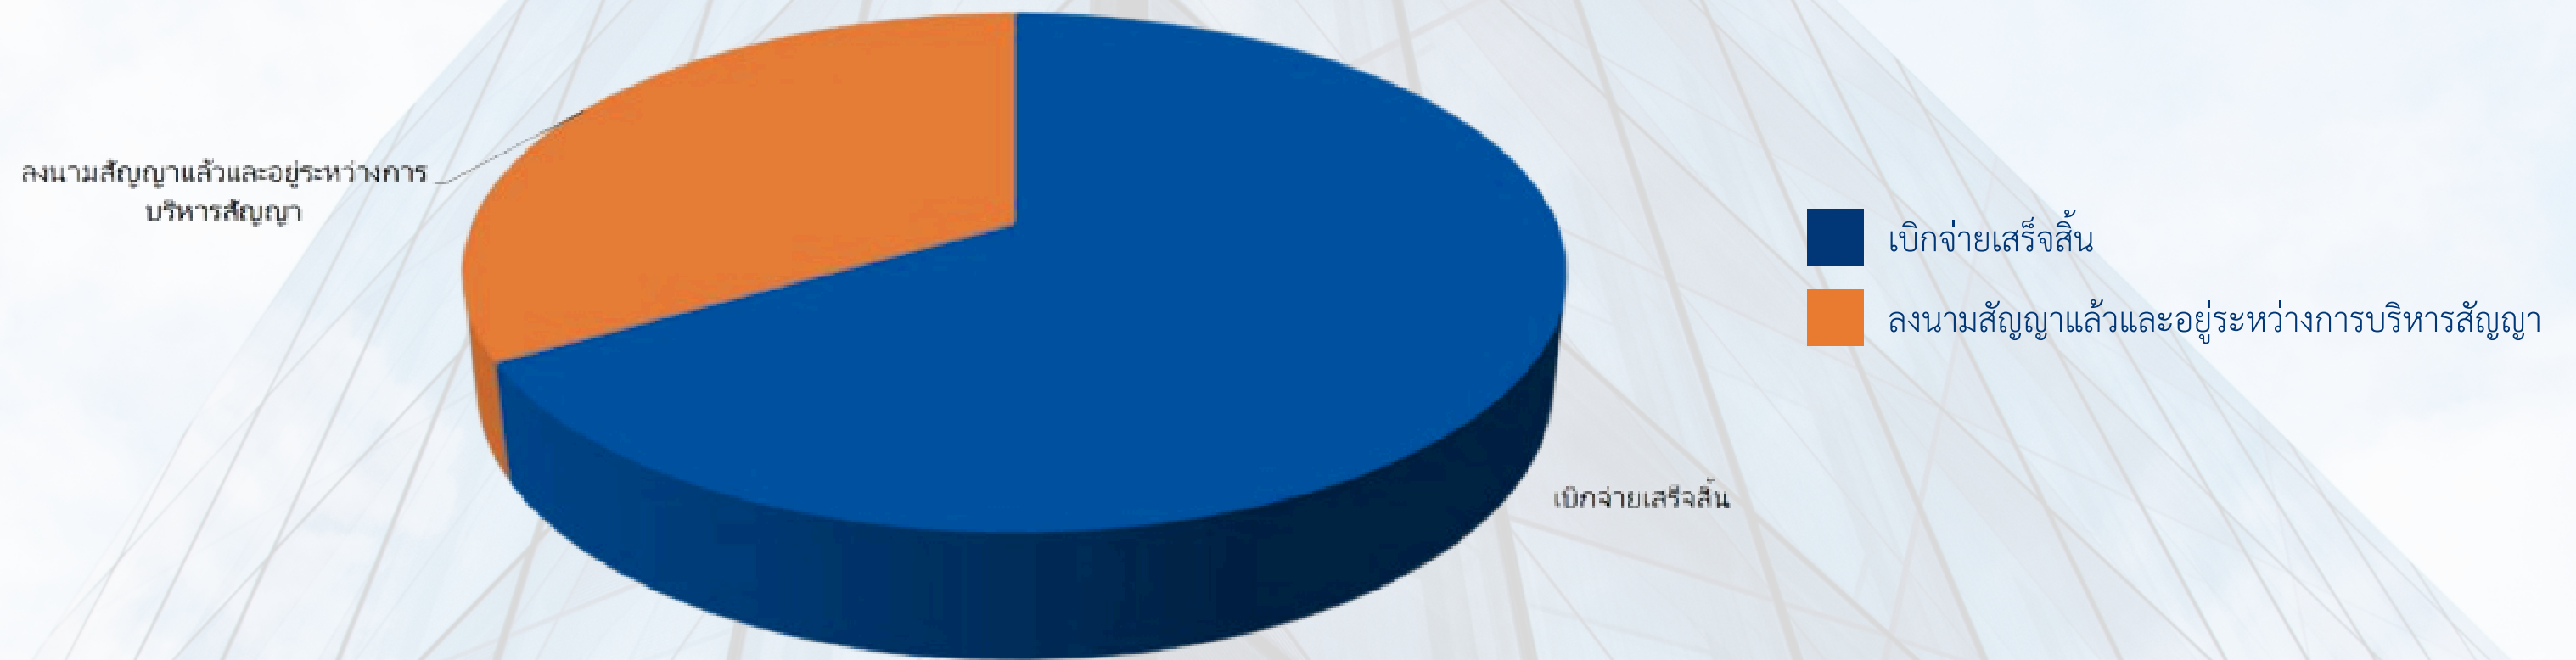

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการกันเหลื่อมปี		จำนวนเงินกันเหลื่อมปี	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	2	50	3,245,600.00	2.95
2	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	2	50	106,808,000.00	97.05
รวม		4	100	110,053,600.00	100.00

( ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 )



## 2 ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

ลำดับ	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	คงเหลือเบิกจ่าย
1	งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง 2 อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	1 มี.ค. 2569	สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งฯ)	7,189,000.00	2,872,000.00
2	งานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลางแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	18 ก.ค. 2569	สำนักงานอธิการบดี	99,619,000.00	89,475,091.20
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				106,808,000.00	92,347,091.20
