


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
งบลงทุน เงินกั้นเพื่อมปีงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 วิทยาเขตจันทบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

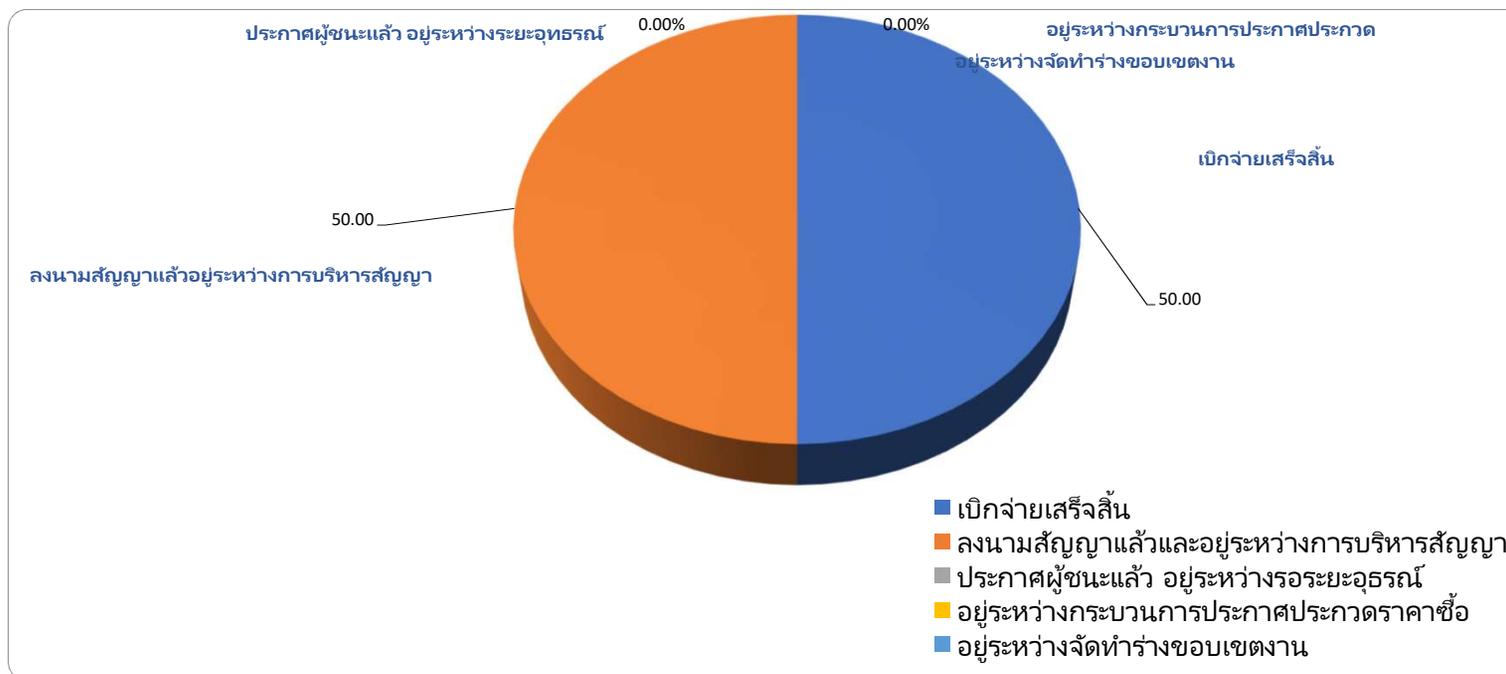

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการ		จำนวนเงิน	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	2	50.00	20,392,900.00	45.11
2	ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	2	50.00	24,817,000.00	54.89
3	ประกาศผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	0	0.00	0.00	0.00
4	อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	0	0.00	0.00	0.00
5	อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน	0	0.00	0.00	0.00
รวม		4	100.00	45,209,900.00	100.00

ลำดับ	1. เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	รายการซุคครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางธุรกิจการบัญชีสำหรับอาคาร SC ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด	25-ธ.ค.-69	คณะเทคโนโลยีสังคม	7,198,700.00	
2	รายการซุคครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Classroom Hybrid System สำหรับอาคาร SC ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด	12 ม.ค. 69	คณะเทคโนโลยีสังคม	13,194,200.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>20,392,900.00</u>	
ลำดับ	2. ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	รายการงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง	12-ม.ค.-69	สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งฯ)	9,807,000.00	
2	อาคารบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 รายการ	30-พ.ย.-70	สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี	15,010,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>24,817,000.00</u>	
ลำดับ	3. ประกาศผู้ชนะ อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>-</u>	

ลำดับ	4. อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศประกวดราคาซื้อ/จ้าง	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	
ลำดับ	5. อยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตงาน	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	-				
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	
