


สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

งบลงทุน เงินกู้ยืมเพื่อปรับปรุงมาตรฐานแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เขตพื้นที่บางพระ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569)

25.00 % อยู่ระหว่างบริหารสัญญา

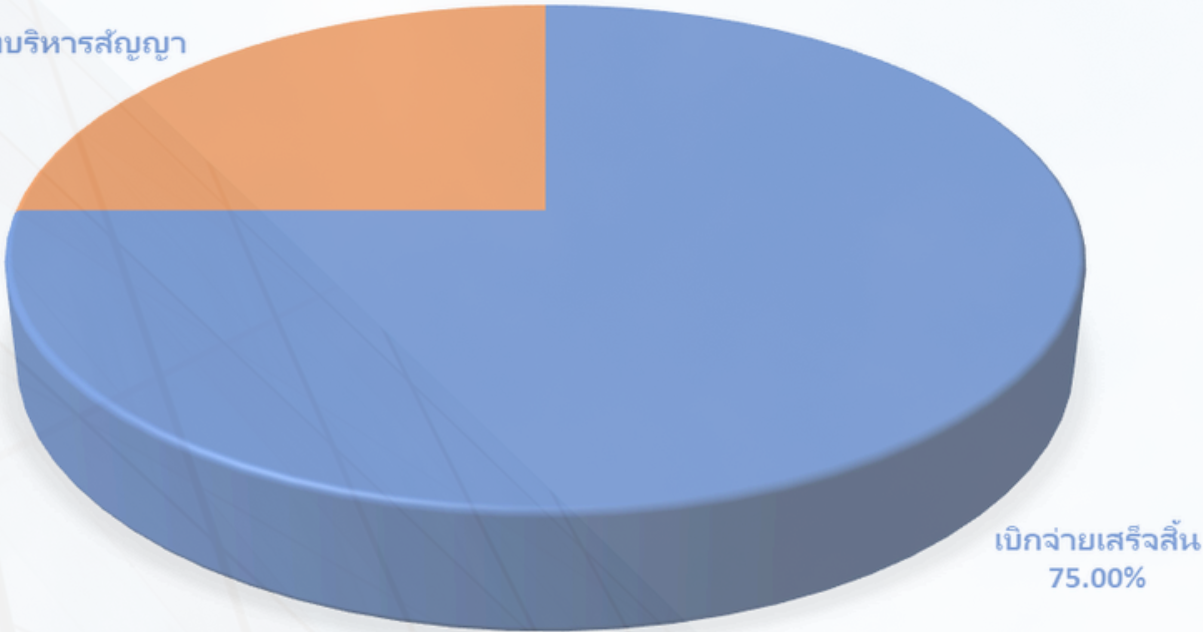

- เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
- ลงนามสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการกันเหลื่อมปี		จำนวนเงินกันเหลื่อมปี	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	3	75	10,425,600.00	9.49
2	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	1	25	99,416,768.00	90.51
รวม		4	100	109,842,368.00	100.00

1 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ลำดับ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	รายการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนประสิทธิภาพการผสมพันธุ์ สุกรและการจัดการหลังการคลอด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	12 ม.ค. 2569	คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ	560,600.00
2	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสุขภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	20 ม.ค 69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,685,000.00
3	รายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง 2 อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน	1 มี.ค. 2569	สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งฯ)	7,180,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				10,425,600.00

2 อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

ลำดับ	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	คงเหลือเบิกจ่าย
1	รายการงานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน <u>งวดที่ 6 เป็นเงิน 19,883,353.60 บาท</u> <u>งวดที่ 7 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u> <u>คาดว่าจะเบิกจ่ายต้นเดือนส.ค. 69</u> <u>งวดที่ 8 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u> <u>งวดที่ 9 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u> <u>ภายในระยะเวลา 11 ก.ย. 69</u>	18 ก.ค. 2569 (ขยายระยะเวลาสัญญา สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย.69)	สำนักงานอธิการบดี	99,416,768.00	49,708,384.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				99,416,768.00	49,708,384.00

2 อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

ลำดับ	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	คงเหลือเบิกจ่าย
1	รายการอาคารบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 รายการ <u>งวดที่ 2 เป็นเงิน 7,697,800.00 บาท</u> <u>งวดที่ 3 เป็นเงิน 384,180.00 บาท</u> <u>งบผูกพัน 68-70</u>	30 พ.ย. 2570	สำนักงานงานวิทยาเขตจันทบุรี	15,010,000.00	8,081,980.00
2	รายการงานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน <u>งวดที่ 6 เป็นเงิน 19,883,353.60 บาท</u> <u>งวดที่ 7 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u> <u>งวดที่ 8 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u> <u>งวดที่ 9 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท</u>	18 ก.ค. 2569 (ขยายระยะเวลาสัญญา สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย.69)	สำนักงานอธิการบดี	99,416,768.00	49,708,384.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				114,426,768.00	57,790,364.00
