
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

งบลงทุน เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ แผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569)



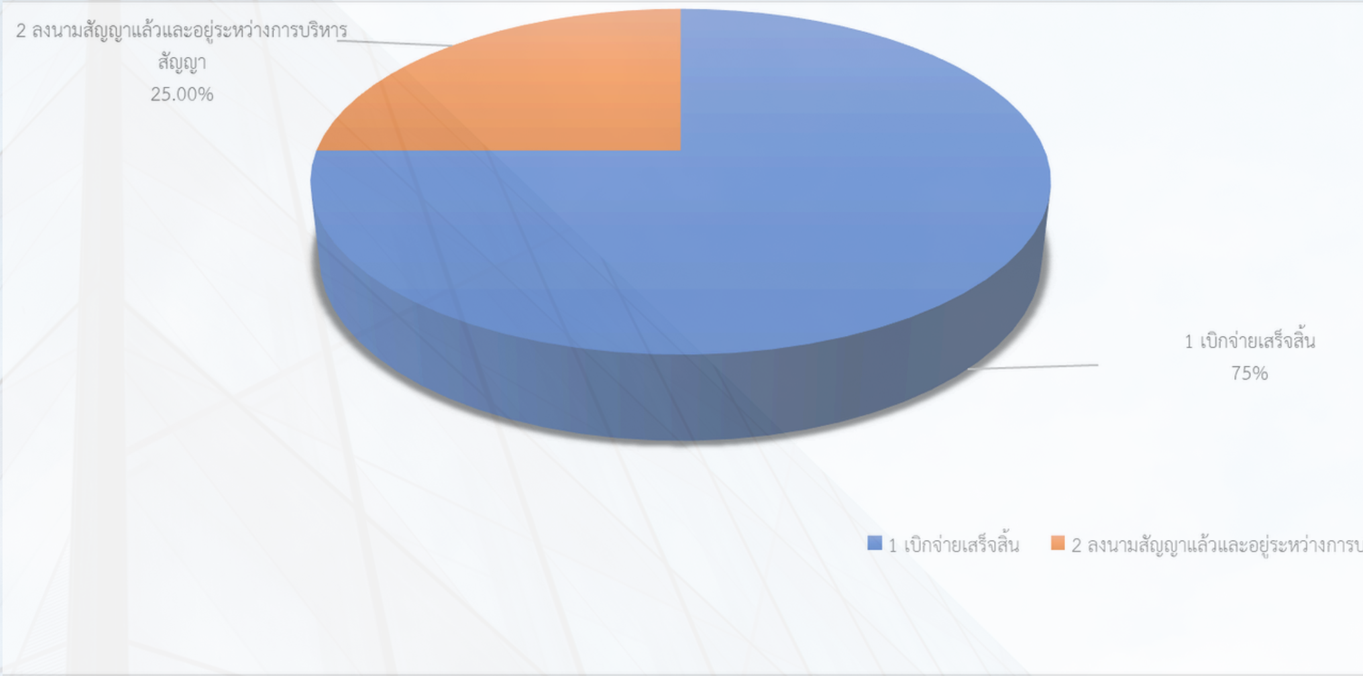

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	โครงการกันเหลื่อมปี		จำนวนเงินกันเหลื่อมปี	
		จำนวนโครงการ	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
1	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	6	75	39,130,600.00	58.32
2	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	2	25	27,965,333.60	41.68
รวม		**8**	**100**	**67,095,933.60**	**100.00**

1 เบิกจ่ายเสร็จสิ้น

ลำดับ	เบิกจ่ายเสร็จสิ้น	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
1	รายการชุดครุภัณฑ์สนับสนุนประสิทธิภาพการผสมพันธุ์สุกรและการจัดการหลังการคลอด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	12 ม.ค. 2569	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	560,600.00
2	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารสุขภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด	20 ม.ค 69	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,685,000.00
3	รายการงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ระหว่าง 2 อาคาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1	1 มี.ค. 2569	สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งฯ)	7,180,000.00
4	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมทางธุรกิจการบัญชีสำหรับอาคาร SC ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด	25 ธ.ค. 2569	คณะเทคโนโลยีสังคม	7,198,000.00
5	รายการชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ Classroom Hybrid System สำหรับอาคาร SC ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 ชุด	12 ม.ค 69	คณะเทคโนโลยีสังคม	13,194,000.00
6	รายการงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง	12 ม.ค. 2569	สำนักงานอธิการบดี (โครงการจัดตั้งฯ)	8,313,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**39,130,600.00**

2 อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา

ลำดับ	อยู่ระหว่างการบริหารสัญญา	ครบกำหนดสัญญา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	คงเหลือเบิกจ่าย
1	รายการอาคารบูรณาการนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 รายการ **งวดที่ 2 เป็นเงิน 7,697,800.00 บาท** **งวดที่ 3 เป็นเงิน 384,180.00 บาท** **คาดว่าเบิกจ่ายภายในวันที่ 25 ก.ย. 69**	30 พ.ย. 2570	สำนักงานงานวิทยาเขตจันทบุรี	15,010,000.00	8,081,980.00
2	รายการงานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน **รายการงานผังบริเวณรวมและพื้นที่ส่วนกลาง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน** **งวดที่ 8 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท** **คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานวันที่ 4 ก.ย. 69** **คาดว่าเบิกจ่ายภายในวันที่ 11 ก.ย. 69** **งวดที่ 9 เป็นเงิน 9,941,676.80 บาท** **คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานวันที่ 11 ก.ย. 69** **คาดว่าเบิกจ่ายภายในวันที่ 25 ก.ย. 69**	18 ก.ค. 2569 (ขยายระยะเวลาสัญญาสิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย.69)	สำนักงานอธิการบดี	99,416,768.00	19,883,353.60
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**114,426,768.00**	**27,965,333.60**
